

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تنفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
☒ تقدم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع: PED-03

اسم الحي: الامير فواز

الى محطة رقم: 214.60+0

من محطة رقم: 100+0

استلام الطبقة: TOP SUB-GRADE

اعمال اخرى:

التاريخ: 10/9/2024 0:00

مهندس الموقع:

المختبر

المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة:

جاهز ☒

غير جاهز ☐

ملاحظات:

نتيجة تدقيق المساحة:

الى المحطة:

من المحطة:

اخرى ☐

القطاع العرضي ☐

القطاع الطولي ☐

مرفقات:

متطابق ☒

غير متطابق ☐

ملاحظات:

الى محطة:

من محطة:

التاريخ: / /

توقيع المساح:

نتيجة تدقيق المواد:

الرطوبة المثلي:

قيمه البركتور:

مرفق ☐

تصنيف المواد

غير مرفق ☐

ملاحظات	النتيجة	نسبة الرطوبة	نسبة الدك	نوعية المواد	رقم المحطة		رقم الاختيار
					من محطة	الى محطة	

التاريخ:

التوقيع:

راسب ☐

ناجح ☐

النتيجة:

إجراءات نتائج الاختبارات

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري:

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع:

التاريخ: / /

تم الاستلام: مندوب المقاول: التوقيع: / /

الإستشارى : مكتب رمك للإستشارات الهندسية

**الإدارة العامة للتقنيـة والإشراف
إدارة تنفيذ الطرق**

المقاول :- شركة طرق الرياض
للمقاولات

تفريد اساتذات طبقة (م)

رقم المشروع :-		تلال الغروب		BLOCK11		BOUOTTOM OF SUPGRADE		TOP SGL	
رقم المخطط :-		رقم الطبقة :-		رقم الطبقة :-		رقم الطبقة :-		رقم الطبقة :-	
0.100		0.100		0.100		0.100		0.100	
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from R
				-5.000	-3.400	-2.400	0.000	2.400	5.000
				2.00%	-2.00%	0.00%	0.00%	-2.00%	2.00%
SLOPE				51.517	51.485	51.505	51.505	51.485	51.517
7	0+100.00	528786.114	2370144.772	51.417	51.385	51.405	51.405	51.385	51.417
10	0+112.50	528797.640	2370139.935	51.323	51.291	51.311	51.311	51.291	51.323
11	0+125.00	528809.167	2370135.099	51.235	51.203	51.223	51.223	51.203	51.235
12	0+137.50	528820.693	2370130.262	51.152	51.120	51.140	51.140	51.120	51.152
13	0+150.00	528832.219	2370125.425	51.072	51.040	51.060	51.060	51.040	51.072
14	0+162.50	528843.746	2370120.589	50.992	50.960	50.980	50.980	50.960	50.992
15	0+175.00	528855.272	2370115.752	50.912	50.880	50.900	50.900	50.880	50.912
16	0+187.50	528866.798	2370110.916	50.832	50.800	50.820	50.820	50.800	50.832
17	0+200.00	528878.325	2370106.079	50.753	50.721	50.741	50.741	50.721	50.753
18	0+212.50	528889.851	2370101.243	50.742	50.710	50.730	50.730	50.710	50.742
19	0+214.60	528891.373	2370100.604						
الإستشاري				50.742	50.710	50.730	50.730	50.710	50.742
				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

الاسم :-

الاسم :-

الاسم :-



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.49
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	10/09/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلأل الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Final Layer of Sub Grade
Location	Block 11 Gardens Area No. 3 STA 0+100 to STA 0+214

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+120	2.347	2.182	7.6	99.6	
2	0+135	2.306	2.147	7.4	98.0	
3	0+150	2.341	2.178	7.5	99.4	
4	0+195	2.350	2.184	7.6	99.7	

M.D.D = 2.191 kg/m3
O.M.C = 7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by



Approved by



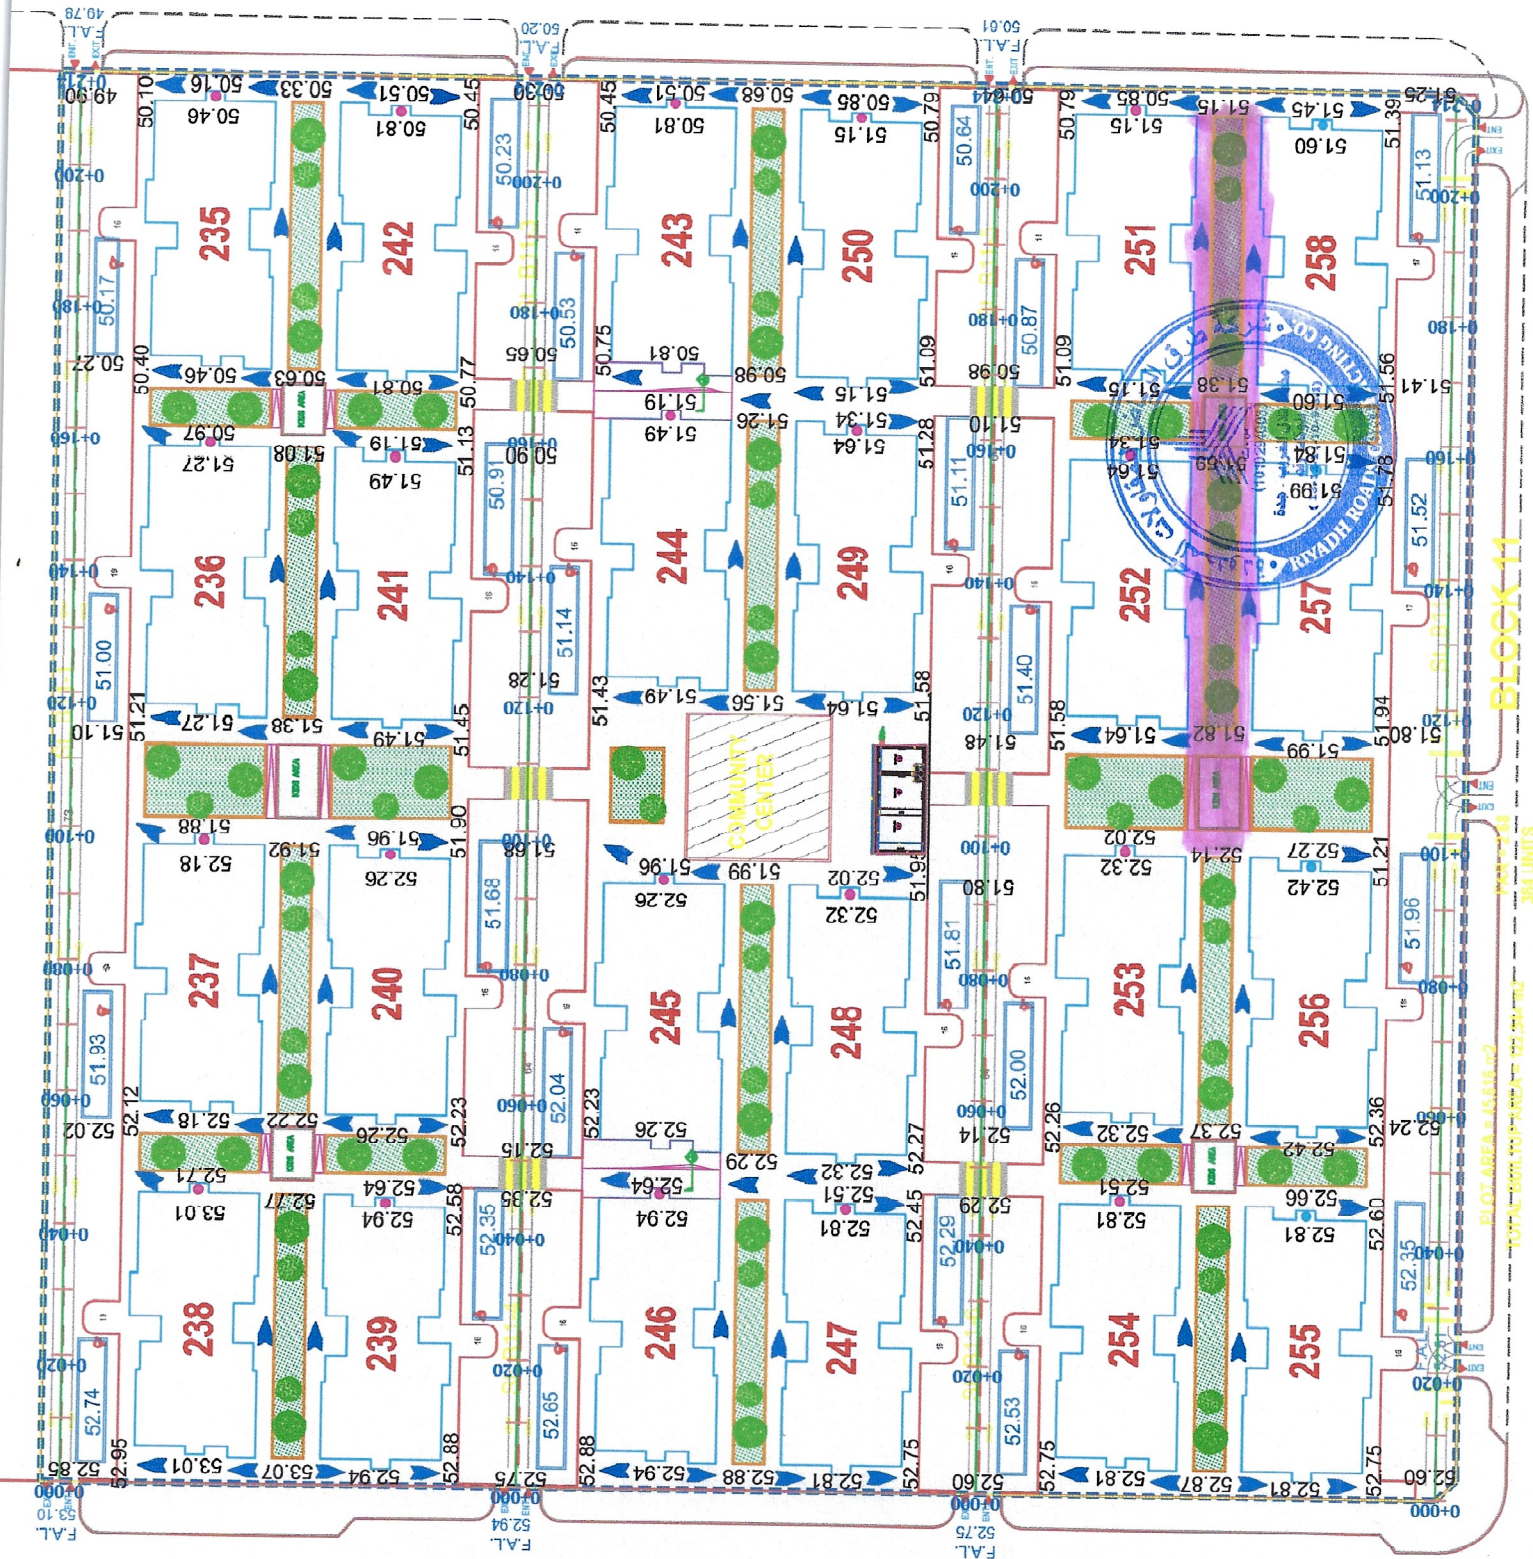

BLOCK 11

PLOT AREA = 15,555 sq. ft.
TOTAL BUILT UP AREA = 122,547 sq. ft.

384 UNITS
